

工事進捗状況

■ 令和5年4月

- ・ 工事進捗率（事業費ベース） 4月末実績 15.0%
- ・ 建屋の地下躯体工事として、地下スラブ（床）コンクリート、免振架台基礎コンクリートの打設しています。
- ・ 敷地西側市道沿いの側溝及び擁壁を敷設、サイトPC工事（上層階の躯体コンクリート部材の製作）を施工しています。




南西より北東側(4/24撮影)



北東側より建屋本体(4/18撮影)

■ 令和5年3月

- ・ 工事進捗率（事業費ベース） 3月末実績 11.5%
- ・ 前月に続き、建屋の地下躯体工事として、地盤の掘削、地下梁の配筋、コンクリートを打設し、敷地内の水路工事（BOXカルバート製）を施工しています。



南西より北東側(3/28撮影)



北東より南西側(3/28撮影)

工事進捗状況

■令和5年2月

- ・ 工事進捗率（事業費ベース） 2月末実績 9.3%
- ・ 建屋の地下躯体工事として、地盤の掘削、地下梁の配筋、コンクリートを打設しています。
- ・ 敷地内の水路工事（BOXカルバート製）を施工しています。




南西より北東側(2/28撮影)



東より西側(2/22撮影)

■令和5年1月

- ・ 工事進捗率（事業費ベース） 1月末実績 7.8%
- ・ 建屋本体の敷地への鋼鉄製基礎杭の打設が完了しました。（全93本、19m/1本）
- ・ 敷地内の水路工事（BOXカルバート製）を施工しています。

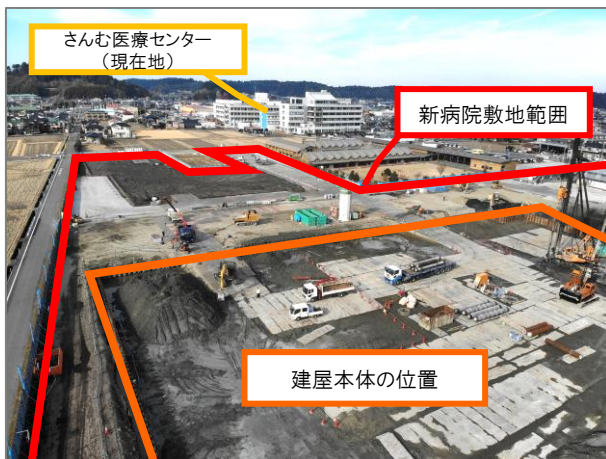

南西より北西側(1/20撮影)




南西より東側(1/20撮影)

工事進捗状況

■令和4年12月

- ・工事進捗率（事業費ベース） 12月末実績 5.0%
- ・建屋本体の敷地に鋼鉄製の基礎杭を打設しています。（全93本、19m/1本、3～4本/1日）
- ・駐車場区画の地下に雨水貯留槽を設置します。




南西より北西側(12/21撮影)



南西より東側(12/21撮影)

■令和4年11月

- ・工事進捗率（事業費ベース） 11月末実績 1.4%
- ・令和4年9月から準備工事として、路盤改良工事等を施工しています。
- ・11月から、建屋本体の工事を開始し、表土の掘削及び地下水流入を防ぐための鋼矢板（シートパイル）を打設しています。



南西より北西側（11/29撮影）
